

AMENAGEMENT DE GUES ET PROTECTION DES BERGES SUR LA FONTAINE DU BLANZAC A ASNOIS (86)




Création de 2 passages à gué et pose de clôtures, sur un linéaire de 350m, sur le ruisseau de La Fontaine du Blanzac, au niveau de sa source, affluent de La Charente, classé en liste 2.

Maître d'ouvrage : CC du Civraisien en Poitou

Période de réalisation et durée des travaux : du 29 mars au 2 avril 2021 (5 jours)

Présentation des objectifs :

- Mise en défens des berges ;
- Permettre le franchissement des animaux et des engins ;
- Limiter l'impact du piétinement des animaux ;
- Communiquer et sensibiliser les propriétaires/usagers sur des travaux d'aménagement.

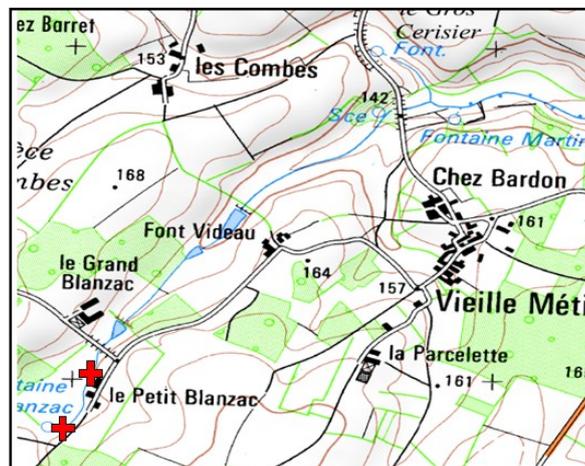

Photos avant et après travaux



Coût total et financements du projet : 7 342€ HT (8 810.40€ TTC) / (Subventions AEAG, RNA et CD86)

Entreprise / Régie : EARL Texereau / Agents du SABAC

Descriptif technique et financier des travaux réalisés :

- Chargement, transport et stockage des matériaux sur le site ;
- Terrassement et décapage de la zone d'implantation sur 20cm ;
- Mise en place de 2 couches de matériaux, silex (200 à 300 mm) et cailloux (20 à 40 mm) ;
- Installation de lisses en bois empêchant l'accès au cours d'eau ;
- Mise en place d'une clôture électrique pour protéger les berges du piétinement.

DEPENSES DU PROJET

Désignation	Unités	Quantités	P.U. en €	Montant HT en €
Matériaux :				
. Silex (200 / 300 mm)	T	55	4	220.00
. Cailloux (20 / 40 mm)	T	30	17	680.00
. Poteaux bois	Ft	8	10	80.00
. Planches bois	ml	32	3	96.00
Sous total :				1 076.00
Petit matériel :				
. Fil de clôture 3x0.3 - 1000m	Ft	1	48	48.00
. Piquets Fer 1m20 – D12 Jaune	Ft	230	2.5	575.00
. Isolateurs D12 – Paquet de 50	Ft	5	7	35.00
. Poste de clôture solaire Master 40. 2CL	Ft	1	250	250.00
. Batterie 12V 80AH - CL	Ft	1	110	110.00
. Visserie Inox 6x100	Ft	1	30	30.00
Sous total :				1 048.00
Mise en œuvre :				
. Transport des matériaux	Ft	6	43	258.00
. Transfert du matériel	Ft	1	60	60.00
. Mise à disposition d'une pelle (8T) avec chauffeur	Ft	60	80	4 900.00
Sous total :				5 218.00
TOTAL GENERAL :				7 342.00

PLAN DE FINANCEMENT

DEPENSES	€ HT	RECETTES	€ HT
. Matériaux	1 076.00	. AEAG	2 298.00
. Petit matériel	1 048.00	. RNA	730.00
. Mise en œuvre	5 218.00	. CD86	2 190.00
		. Propriétaires	2 124.00
TOTAL DEPENSES	7 342.00	TOTAL RECETTES	7 342.00

Etat des lieux avant / après :

Avant : Lit mineur surdimensionné avec dégradation et érosion des berges par le piétinement intensif du bétail. Disparition de la végétation rivulaire. Ecoulement ralenti avec envasement et réchauffement du cours d'eau.

Après : Berges protégées du piétinement.

Informations sur les aspects administratifs

DIG (arrêté préfectoral N° 2017-DDT-SEB-681 du 26 juillet 2017)

Suivi mis en place :

Suivi photographique

Commentaires :

Les travaux, à la demande du propriétaire, répondent à ses attentes en offrant 2 passages stabilisés pour les engins et les animaux.

Aucun projet de plantation rivulaire n'est envisagé pour le moment, mais reste une option dans l'avenir.

Contact pour tout renseignement sur ce projet :

Jérôme Mémin – 06 76 21 31 99 – rivieres@civraisienpoitou.fr

Président de la commission « Eaux, assainissement et rivières » : Philippe BELLIN

Délégué communautaire SABAC : Thierry NEEL
