


## PROTECTION DES BERGES ET ABREUVOIRS SUR LA FONTAINE DU BLANZAC A ASNOIS (86250)



La Fontaine du Blanzac (liste 2), complètement restaurée hydromorphologiquement depuis 2019, présentait encore 2 linéaires distincts à protéger, car piétinés, depuis des décennies par les bovins.

En partenariat avec les propriétaires et les éleveurs, 6 abreuvoirs ont été aménagés et/ou créés et près 500m de clôture installée.

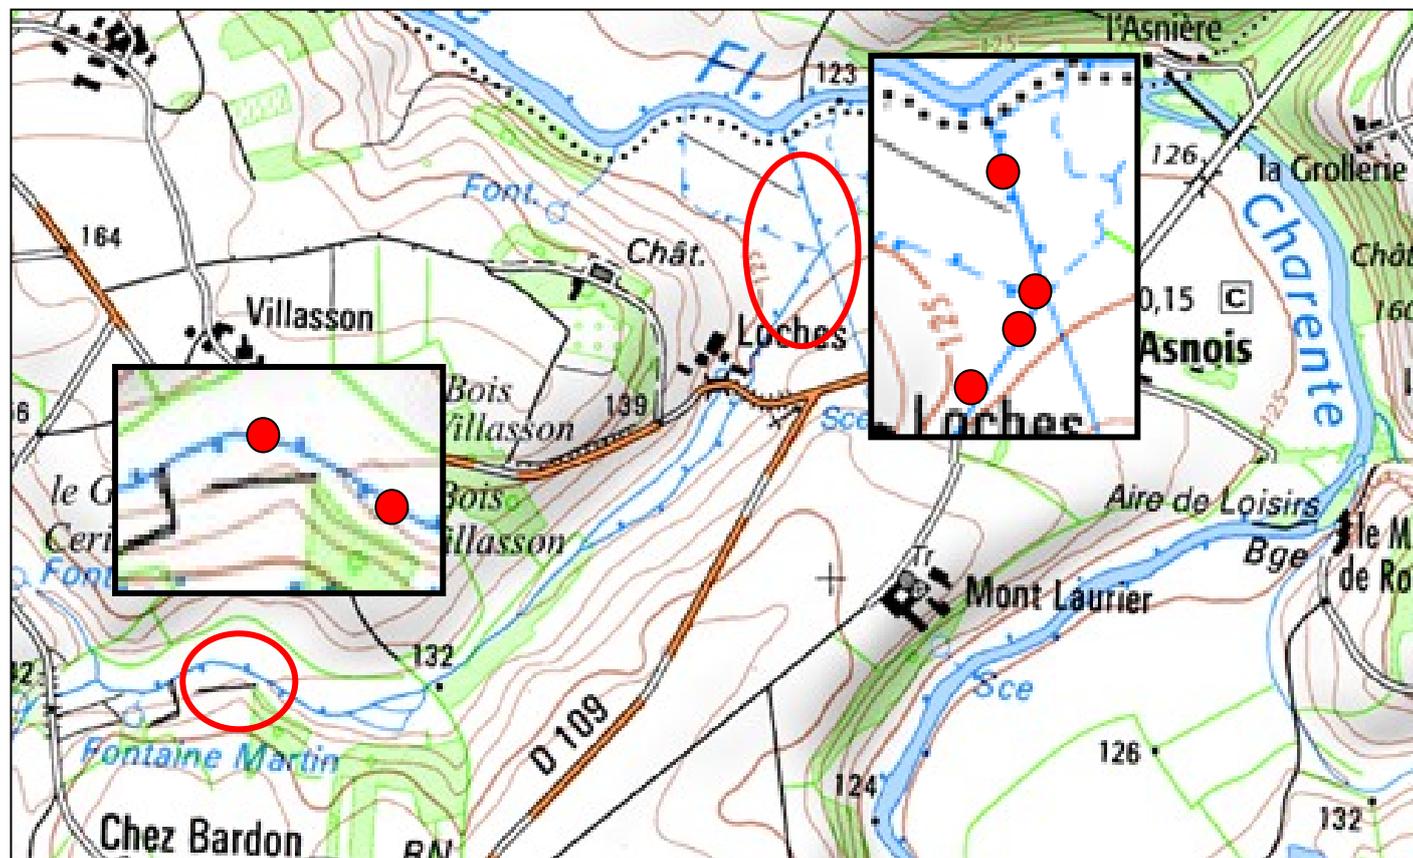

**Maître d'ouvrage :** CC du Civraisien en Poitou

**Période de réalisation et durée des travaux :** du 3 au 5 août 2022 (3 jours)

### Présentation des objectifs :

- Limiter l'impact lié au piétinement en mettant fin à la descente du bétail dans le lit du cours d'eau grâce à l'installation de clôtures ;
- Mettre un terme à la dégradation des berges, au colmatage de la rivière, à la dégradation de la qualité de l'eau, au piétinement d'espèces et d'habitats protégés ;
- Soutenir l'élevage en proposant une alternative d'abreuvement ;
- Préserver la souche d'écrevisse à pieds blancs présente dans le cours d'eau ;
- Communiquer sur les engagements de la collectivité de tendre vers le Bon Etat Ecologique de la vallée de La Charente et de ses affluents et sensibiliser sur des travaux d'aménagement visant à restaurer la biodiversité.



### Descriptif technique et financier des travaux réalisés :

- Abattage et élagage des secteurs d'implantation des abreuvoirs
- Livraison des matériaux (silex 5/20cm) ;
- Mise en œuvre à la pelle mécanique :
  - o Décaisser la zone en retirant la couche superficielle et en allant chercher le « dur » ;
  - o Délimiter l'abreuvoir en enfonçant les piquets de clôture (de préférence en acacia) ;
  - o Etaler les silex sur 20 à 40 cm d'épaisseur ;
  - o Cheniller la zone ;
  - o Étendre les matériaux de finition (0/31.5) et passer la plaque vibrante.

**Entreprise / Régie :** SCOP STPR / Agents du SABAC

### Descriptif financier et plan de financement :

PLAN DE FINANCEMENT – FONTAINE DU BLANZAC / ASNOIS			
DEPENSES	€ HT	RECETTES	€ HT
<b>Matériaux</b>	<b>231.75</b>	<b>Agence de l'Eau Adour Garonne</b>	<b>1 226.00</b>
. Calcaire (0/31.5) – 21.3T	231.75	<b>Région Nouvelle Aquitaine</b>	<b>300.00</b>
<b>Matériel clôtures</b>	<b>428.33</b>	<b>Conseil Départemental de la Vienne</b>	<b>900.00</b>
<b>Mise en œuvre des matériaux</b>	<b>2 405.00</b>	<b>CC Civraisien en Poitou</b>	<b>639.08</b>
. Création 6 abreuvoirs	2 405.00		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 065.08</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 065.08</b>

### Etat des lieux avant / après :

**Avant :** Secteurs du cours d'eau piétinés par les bovins, qui divaguaient dans le lit.

Présence de nombreuses zones d'abreuvement, occasionnant une érosion des berges et des matières en suspension.

**Après :** Berges et ripisylve protégées par la pose de clôtures.

Zones d'abreuvement identifiées et aménagées.

### Informations sur les aspects administratifs

DIG (arrêté préfectoral N° 2017-DDT-SEB-681 du 26 juillet 2017)

### Informations complémentaires sur la prestation

Les travaux ont été réalisés lors de période sèche et de basses eaux, afin d'éviter une dégradation des abords et des chemins d'accès.

Les éleveurs et/ou propriétaires ont fourni les piquets bois de clôtures et ont participé à la maîtrise d'œuvre des travaux.

### Suivi mis en place :

Suivi photographique

### Commentaires :

### Contact pour tout renseignement sur ce projet :

Jérôme Mémin – 06 76 21 31 99 – [rivieres@civraisienpoitou.fr](mailto:rivieres@civraisienpoitou.fr)

Président de la commission « Eaux, assainissement et rivières » : Philippe BELLIN

Délégué communautaire SABAC : Thierry NEEL
